

2023年下半年选择题试题和解析（10月29日第2批）

（由于机考后没有真题，题目为根据学员回忆的考试知识点编的原创题目，部分题目缺失，正常考试是75个题）

试题1- 【2023年下半年-第1题】

() 标准规定了物联网系统实体间接口的具体功能要求。

A. GB/T35319 物联网系统接口要求

B. GB/T33474 物联网参考体系结构

C. GB/Z33750 物联网标准化工作指南

D. GB/T36478.1 物联网信息交换和共享第1部分：总体架构


【答案】A

【解析】P724, 如下图

标准编号	标准名称	主要内容	适用范围	类别
GB/Z 33750	物联网标准化工作指南	该指南制定了物联网标准化工作原则、工作程序、标准名称的结构和命名以及物联网标准分类	该指导性技术文件适用于：①以物联网作为名称要素的国家标准的管理工作；②物联网基础共性标准的研制工作	国家标准
GB/T 33474	物联网参考体系结构	该标准给出了物联网概念模型，并从系统、通信、信息三个不同的角度给出了物联网参考体系结构	该标准适用于各应用领域物联网系统的设计，为物联网系统设计提供参考	国家标准
GB/T 35319	物联网系统接口要求	该标准规定了物联网系统实体间接口的具体功能要求	该标准适用于物联网系统实体间接口的设计、开发和应用	国家标准
GB/T 36478.1	物联网信息交换和共享第1部分：总体架构	该部分规定了物联网系统之间进行信息交换和共享包含的过程活动、功能实体和共享交换模式	该部分适用于物联网系统之间信息交换和共享的规划、设计、系统开发以及运行维护管理	国家标准

试题2- 【2023年下半年-第2题】

下图为某地区的通信线路图，图中节点为8个城市，节点间标识的数字为城市间拟铺设通信线路的长度，为了保持8个城市通讯连接，则至少铺设() 千米的线路。

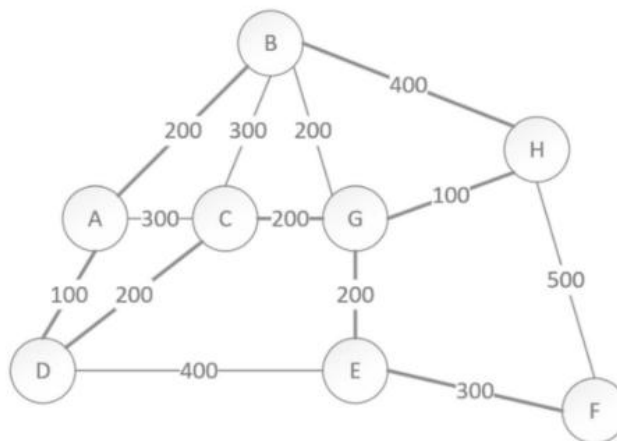

A.1000 B.1100 C.1200 D.1300

【答案】D

【解析】先断开最大的，然后保留最小和次小的，最后再断次小的，最终保证村村通路路通：
 $200+100+200+200+100+200+300=1300$;

试题3- 【2023年下半年-第3题】

以下()不是度量绩效域需要重点关注的内容。

A. 制定有效的度量指标 B. 度量内容及相应指标 C. 度量陷阱 D. 风险

【答案】D

【解析】P542，在项目整个生命周期过程中，为了有效执行度量绩效域，项目经理需要重点关注制定有效的度量指标、度量内容及相应指标、展示度量信息和结果、度量陷阱、基于度量进行诊断、持续改进。

试题4- 【2023年下半年-第4题】

某项目设计方案总投资2995万元，投产后年经营成本为500万元，年营业收入额为1500万元，第3年末工程项目配套追加投资1000万元，若计算期为5年，基准收益率为10%，残值等于零，试计算投资方案的净现值。

年份	第0年	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
投资	2995			1000		
收入		1500	1500	1500	1500	1500
成本		500	500	500	500	500

A. 44.4 B. 44.8 C. 44.6 D. 44.5

【答案】A

【解析】

年份	第0年	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
投资	2995			1000		
收入		1500	1500	1500	1500	1500
成本		500	500	500	500	500
净值	-2995	1000	1000	0	1000	1000
现值	-2995	909.1	826.4		683	620.9

$NPV = -2995 + 909.1 + 826.4 + 0 + 683 + 620.9$ 万元 = 44.4 万元

试题5- 【2023年下半年-第5题】


某项目包含ABCDEFGHIJ共10个活动，各活动历时与逻辑关系如下表所示，施工过程中，活动B延期2天，项目工期是()天

活动名称	活动历时(天)	前置活动
A	2	
B	2	A
C	3	A
D	4	A
E	3	B
F	4	C、D
G	4	E、F
H	3	G
I	2	G
J	1	H、I

A.17 B.18 C.19 D.20

【答案】B

【解析】画七格图如下，B 的总时差是3, 延期两天，对工期没有影响。

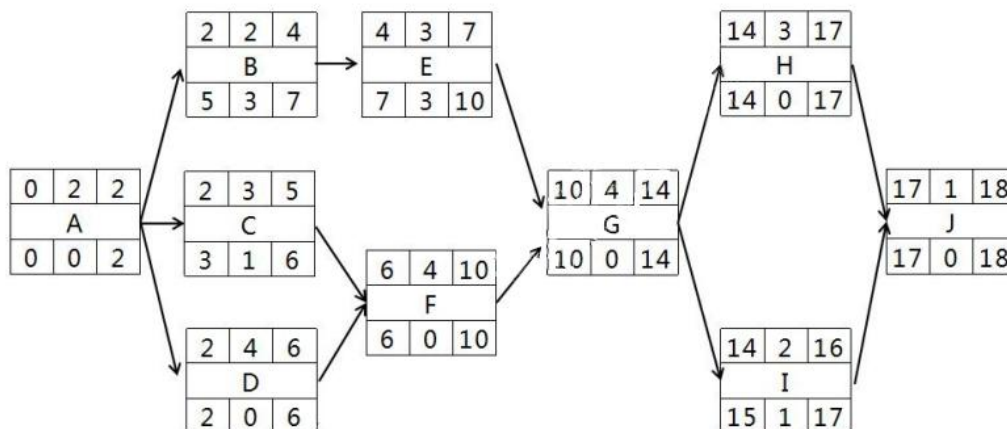

试题6- 【2023年下半年-第6题】

以下()不是规划干系人管理的输入。

A. 资源管理计划 B. 风险管理计划 C. 干系人登记册 D. 干系人参与计划

【答案】D

【解析】P510-511，干系人参与计划是输出。

试题7- 【2023年下半年-第7题】

项目()对规划采购管理过程中的采购策略制定有重要影响。在制订采购管理计划时所做出的决定也会影响项目()。

A. 质量计划 B. 进度计划 C. 风险计划 D. 范围计划

【答案】B

【解析】P475，项目进度计划对规划采购管理过程中的采购策略制定有重要影响。在制订采购管理计划时所做出的决定也会影响项目进度计划。在开展制定进度计划过程、估算活动资源过程以及自制或外购决策制定时，都需要考虑这些决定。

试题8- 【2023年下半年-第8题】

()识别、定义、组合、统一和协调各项目管理过程组的各个过程和活动。

A.整合管理 B. 范围管理 C.进度管理 D.成本管理

【答案】A

【解析】P219, 整合管理：识别、定义、组合、统一和协调各项目管理过程组的各个过程和活动。

试题9- 【2023年下半年-第9题】

在给大家讲课过程中，告诉大家10大管理的论文非常重要，要大家不要去想押题， 必须全面学习，大家也及时收到了消息，很多学员认可了的观点，但是他不执行， 目前是处于()。

A.已转化为积极的行动 B. 已收到 C. 已理解已认可 D.已认可

【答案】D

【解析】P415, 沟通模型包含5种状态：已发送、已收到、已理解、已认可、已转化为积极的行动。

(1) 已发送：信息已发送。

(2) 已收到：对方信息已收到。但这并不表示对方有意图去读取、理解或解决信息。

(3) 已理解：正确地消化和理解信息中的内容是简单接收信息中关键的一环。

(4) 已认可理解了传达的信息并不代表对方已同意这个观点。或许对方明白了发送者的意思，但完全不同意。所以在两个聪明的、有主见的人之间达成一致既复杂又耗时，尤其是两个人的观点不能清晰地对方阐述的时候。因此，达成一致仍然是做出项目决策和有效沟通的关键一环。

(5) 已转化为积极的行动正确地理解和达成一致的认可比较难，但更加困难的是让对方转化为实际的、积极的行动，而且是方向正确无误的行动。这是整个过程中最难的一环，通常需要反复地沟通，在一定的监督或帮助下才能较好地完成。

试题10- 【2023年下半年-第10题】

以下()不是定量风险分析的工具和技术。

A. 气泡图 B.期望货币值 C.蒙特卡洛 D. 敏感性分析

【答案】A

【解析】P454-456, 气泡图是定性风险分析的工具。

试题11- 【2023年下半年-第11题】

以下关于项目组合管理生命周期的说法中，错误的是()。

A.项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化4个阶段组成

B. 规划阶段制订并评审项目组合管理计划并就主要内容与干系人达成共识。

C. 优化阶段通过其各个组件和运营来实施的，包括对项目组合的执行情况，以及各组件的绩效标准进行评审和汇报对提出的变更基于持续的组织需要来进行评审，组织环境的变更可能迫使组件优先顺序要重新排列或者引入新组件

D. 启动阶段的活动包含验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合及其组件定义长期路线图，包括财务目标、绩效标准、沟通、治理、干系人的定义与角色，以及持续管理计划。

【答案】C

【解析】P579-580, 项目组合生命周期：项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化4个阶段组成。

(1) 启动阶段。此阶段的主要活动是验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合及其组件定义长期路线图，包括财务目标、绩效标准、沟通、治理、干系人的定义与角色，以

及持续管理计划。

(2) 规划阶段。规划阶段制订并评审项目组合管理计划并就主要内容与干系人达成共识。

(3) 执行阶段。执行阶段是通过其各个组件和运营来实施的，包括对项目组合的执行情况，以及各组件的绩效标准进行评审和汇报对提出的变更基于持续的组织需要来进行评审，组织环境的变更可能迫使组件优先顺序要重新排列或者引入新组件。

(4) 优化阶段。通过最大化可用的条件、制约因素和资源，使项目组合尽可能高效的过程。组织通常会安排定期的优化，但在增加或关闭组件时，也会触发此活动。

试题12- 【2023年下半年-第12题】

以下关于文档的说法中，错误的是()。

A.对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。

B.产品文档描述开发过程的产物，基本的产品文档包括：培训手册、参考手册和用户指南、软件支持手册、产品手册和信息广告。

C.工作文档(3级文档):适合于由同一单位内若干人联合开发的程序，或可被其他单位使用的程序。

D.文档书写规范是在管理信息系统的开发过程中用到很多的图表，对这些图表进行有规则地编号，可以方便图表的查找。

【答案】D

【解析】P570, 文档的规范化管理主要体现在文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标准和文档管理制度等几个方面。

(1) 文档书写规范。管理信息系统的文档资料涉及文本、图形和表格等多种类型，无论是哪种类型的文档都应该遵循统一的书写规范，包括符号的使用、图标的含义、程序中注释行的使用、注明文档书写人及书写日期等。

(2) 图表编号规则。在管理信息系统的开发过程中用到很多的图表，对这些图表进行有规则地编号，可以方便图表的查找。

(3) 文档目录编写标准。为了存档及未来使用的方便，应该编写文档目录。管理信息系统的文档目录中应包含文档编号、文档名称、格式或载体、份数、每份页数或件数、存储地点、存档时间、保管人等。

(4) 文档管理制度。文档的管理制度须根据组织实体的具体情况而定，主要包括建立文档的相关规范、文档借阅记录的登记制度、文档使用权限控制规则等。

试题13- 【2023年下半年-第13题】

以下关于车联网的说法中，错误的是()。

A.车联网(IoV) 系统是一个“端、管、云”三层体系

B.管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通，实现车辆自组网及多种异构网络之间的通信与漫游，在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性，同时它是公网与专网的统一体

C.车与云平台间的通信是指车辆通过卫星无线通信或移动蜂窝等无线通信技术实现与车联网服务平台的信息传输，接收平台下达的控制指令，实时共享车辆数据

D.云系统是汽车的智能传感器负责采集与获取车辆的智能信息，感知行车状态与环境；是具有车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终端；同时还是让汽车具备IoV寻址和网络可信标识等能力的设备。

【答案】D

【解析】P11, 车联网(IoV) 系统是一个“端、管、云”三层体系。

(1)端系统。端系统是汽车的智能传感器负责采集与获取车辆的智能信息，感知行车状态与环境；是具有车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终端；同时还是让汽车具备IoV寻址和网络可信标识等能力的设备。

(2)管系统。管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通，实现车辆自组网及多种异构网络之间的通信与漫游，在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性，同时它是公网与专网的统一体。

(3)云系统。车联网是一个云架构的车辆运行信息平台，它的生态链包含了ITS、物流、客货运、危特车辆、汽修汽配、汽车租赁、企事业车辆管理、汽车制造商、4s店、车管、保险、紧急救援、移动互联网等，是多源海量信息的汇聚，因此需要虚拟化、安全认证、实时交互、海量存储等云计算功能，其应用系统也是围绕车辆的数据汇聚、计算、调度、监控、管理与应用的复合体系。

试题14- 【2023年下半年-第14题】

()将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。

- A. 因果图 B. 亲和图 C. 甘特图 D. 直方图

【答案】 A

【解析】 P371，因果图将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。

试题15- 【2023年下半年-第15题】

随着新技术的不断涌现，社交网络、多元文化、虚拟团队和新的价值观等的出现，组织和项目所处的环境发生了很大变化。在执行并管理整合时，项目经理需要意识到项目背景和这些新因素，决定如何在项目中最好地利用这些新环境因素，以获得项目成功。这是属于()。

- A.背景层面执行整合 B.认知层面执行整合
C.过程层面执行整合 D.管理层面执行整合

【答案】 A

【解析】 P237

(1)过程层面执行整合

项目管理过程中有些过程可能只发生一次(例如项目章程的初始创建);但很多过程在整个项目期间会相互重叠并重复发生多次。这种重叠和多次出现的过程，比如需求变更，它会影响范围、进度或预算，并需要提出变更请求。控制范围过程和实施整体变更控制过程包括变更请求。在整个项目期间实施整体变更控制过程是为了整合变更请求。

(2)认知层面执行整合

管理项目有多种方法，项目经理的人际关系技能和能力与其管理项目的方式紧密相关，方法的选择通常取决于项目的具体特点，包括规模、项目或组织的复杂性，以及组织文化。项目经理应尽量熟练掌握所有项目管理知识领域，帮助项目经理将经验、见解、领导力、技术以及商业管理技能运用到项目管理中，并帮助项目经理整合这些知识领域所涵盖的过程，实现预期的项目结果。

(3)背景层面执行整合

随着新技术的不断涌现，社交网络、多元文化、虚拟团队和新的价值观等的出现，组织和项目所处的环境发生了很大变化。在执行并管理整合时，项目经理需要意识到项目背景和这些新因素，决定如何在项目中最好地利用这些新环境因素，以获得项目成功。例如，项目经理在指导项目团队进行沟通规划和知识管理时需要考虑新背景产生的影响，需要面临涉及多个组织的、大规模、跨职能项目实施中的知识和人员。

试题16- 【2023年下半年-第16题】

()是高效做事。

- A. 技术 B.资源 C. 人员 D.过程

【答案】A

【解析】P122, 人员“选人做事”;资源“保障做事”;技术“高效做事”;过程“正确做事”;

试题17- 【2023年下半年-第17题】

以下()不是人工智能的技术。(英语)

- A.机器学习 B.神经网络 C.NLP D.虚拟化

【答案】D

【解析】P161,人工智能的关键技术主要涉及机器学习、自然语言处理、专家系统等技术。(NLP)神经网络是机器学习的一种形式。

试题18- 【2023年下半年-第18题】

()是在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

- A.矩阵图 B.直方图 C. 甘特图 D.亲和图

【答案】A

【解析】P371, 矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

试题19- 【2023年下半年-第19题】

以下说法中,错误的是()。

- A.亲和图可以对潜在缺陷成因进行分类,展示最应关注的领域
B.直方图是一种展示数字数据的条形图,可展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因排列、各个过程的不合规次数,或项目或产品缺陷的其他表现形式
C.横道图也称为“甘特图”,是展示进度信息的一种图表方式
D.假设情景分析是把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化的方法,以评估它们对项目目标的潜在影响。最常见的技术是蒙特卡罗分析

【答案】D

【解析】P320,

(1)假设情景分析:是对各种情景进行评估,预测它们对项目目标的影响(积极或消极的)。假设情景分析就是对“如果情景X出现,情况会怎样?”这样的问题进行分析

(2)模拟:是把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化的方法,以评估它们对项目目标的潜在影响。最常见的模拟技术是蒙特卡罗分析。

试题20- 【2023年下半年-第20题】

以下说法中,错误的是()。

- A.CORBA是OMG进行标准化分布式对象计算的基础
B.DCOM作为COM的扩展,不仅继承了COM优点,而且针对分布环境还提供了一些新的特性,如位置透明性、网络安全性、跨平台调用
C.COM+为COM的新发展或COM更高层次上的应用,其底层结构仍然以COM为基础,几乎包含了COM的所有内容
D.J2EE的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层和信息系统层。

【答案】D

【解析】P168-169,J2EE 的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层、EJB 层和信息系统层。

试题21- 【2023年下半年-第21题】

一般的采购步骤为：①准备采购工作说明书 (SOW) 或工作大纲 (TOR);② 准备高层级的成本估算，制定预算；③发布招标公告；④确定合格卖方的名单；⑤准备并发布招标文件；⑥由卖方准备并提交建议书；⑦对建议书开展技术(包括质量)评估；⑧对建议书开展成本评估；⑨准备最终的综合评估报告(包括质量及成本)，选出中标建议书；⑩结束谈判，买方和卖方签署合同。

其正确的是排序是()。

- A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
- B.⑤⑥⑦⑧⑨⑩①②③④
- C.①②③④⑦⑧⑨⑩⑤⑥
- D.⑧⑨⑩①⑤⑥⑦②③④

【答案】A

【解析】P475，一般的采购步骤为：①准备采购工作说明书 (SOW)或工作大纲 (TOR);② 准备高层级的成本估算，制定预算；③发布招标公告；④确定合格卖方的名单；⑤准备并发布招标文件；⑥由卖方准备并提交建议书；⑦对建议书开展技术(包括质量)评估；⑧对建议书开展成本评估；⑨准备最终的综合评估报告(包括质量及成本)选出中标建议书；⑩结束谈判，买方和卖方签署合同。

试题22- 【2023年下半年-第22题】

在项目集生命周期中被执行的活动取决于项目集的具体类型，通常在资金获得批准和项目集经理被指定前开始。为成功向组织交付效益，项目集要分为3个主要阶段来实施，包括()、项目集交付阶段和项目集收尾阶段。

- A. 项目集构建阶段
- B. 项目集启动阶段
- C. 项目集规划阶段
- D. 项目集定义阶段

【答案】D

【解析】P577， 为成功向组织交付效益，项目集要分为3个主要阶段来实施，包括项目集定义阶段、项目集交付阶段和项目集收尾阶段

试题23- 【2023年下半年-第23题】

以下关于干系人管理过程的作用不正确的是()。

- A.识别干系人过程的主要作用是，使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注
- B.规划干系人参与过程的主要作用是，提供与干系人进行有效互动的可行计划
- C.管理干系人参与过程的主要作用是，及时向干系人提供相关信息，引导干系人有效参与项目
- D.监督干系人参与过程的主要作用是，随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果

【答案】C

【解析】P505，管理干系人参与过程的主要作用是，尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度。

规划沟通管理过程的主要作用：①及时向干系人提供相关信息；②引导干系人有效参与项目；③编制书面沟通计划。

试题24- 【2023年下半年-第24题】

以下说法中，错误的是（）。

- A. “一网通办”是依托于一体化在线政务服务平台，通过规范网上办事标准，优化网上办事流程，搭建统一的互联网政务服务总门户，整合政务服务数据资源和完善配套制度等措施，推行政务服务事项网上办理，推动企业群众办事线上只登录一次即可全网通办。
- B. “跨省通办”是申请人在办理地之外的省市提出事项申请或在本地提出办理其他省市事项申请，办理模式通常可分为全程网办、代收代办和多地联办等。
- C. “一网统管”通常从城市治理突出问题出发，以城市事件为牵引，统筹管理网格，统一城市运行事项清单，构建多级城市运行“一网统管”应用体系，推动城市管理、应急指挥、综合执法等领域的“一网统管”，实现城市运行态势感知、体征指标监测统一事件受理、智能调度指挥、联动协同处置、监督评价考核等全流程监管。
- D. 一网通指通过对多个部门的数据进行整合，将城市运行情况充分反映出来。

【答案】D

【解析】P22，“一网统管”建设通常强调：

- (1) 一网：主要包括政务云、政务网和政务大数据中心等。
- (2) 一屏：通过对多个部门的数据进行整合，将城市运行情况充分反映出来。
- (3) 联动：畅通各级指挥体系，为跨部门、跨区域、跨层级联勤联动、高效处置提供快速响应能力。
- (4) 预警：基于多维、海量、全息数据汇集，实现城市运行体征的全量、实时掌握和智能预警。
- (5) 创新：以管理需求带动智能化建设，以信息流、数据流推动业务流程全面优化和管理创新。

试题25- 【2023年下半年-第25题】

以下（）不是干系人登记册的内容。

- A. 身份信息
- B. 评估信息
- C. 干系人分类
- D. 干系人参与计划

【答案】D

- 【解析】**P508-509，干系人登记册是识别干系人过程的主要输出，记录已识别干系人的信息，主要包括：
- (1) 身份信息：姓名、组织职位、地点、联系方式，以及在项目中扮演的角色。
 - (2) 评估信息：主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及干系人最能影响或冲击的项目生命周期阶段。
 - (3) 干系人分类用内部或外部，作用、影响、权力或利益，上级、下级、外围或横向，或者项目经理选择的其他分类模型进行分类的结果等。

试题26- 【2023年下半年-第26题】

项目管理是主动的，组织项目绩效是可预测的。项目团队遵循组织建立的OPM 流程，这些流程根据项目的复杂性和从业者的能力加以裁剪。OPM 流程在组织上是标准化的、可测量的、可控制的，并可由组织进行分析，以监控OPM流程绩效是（）的特点。

- A. 级别1, 初始或临时的OPM
- B. 级别2, 项目层级采用OPM
- C. 级别3, 组织定义的OPM
- D. 级别4, 量化管理的OPM

【答案】C

【解析】P 5 8 7 ,请 见 下 表 。

(1) 级别1。初始或临时的OPM。项目绩效无法可靠预测。项目管理极不稳定，高度依赖于

执行工作的人员的经验和能力。项目虽然完成，但经常出现推迟、超出预算、质量各异的情况。存在的OPM流程是临时的或无序的。

(2) 级别2。项目层级采用OPM。根据行业最佳实践，在项目或职能层级上计划、执行、监督和控制项目。但是OPM流程和实践并非从组织角度统一应用或管理，并且可能存在项目差异。

(3) 级别3。组织定义的OPM。项目管理是主动的，组织项目绩效是可预测的。项目团队遵循组织建立的OPM流程，这些流程根据项目的复杂性和从业者的能力加以裁剪。OPM流程在组织上是标准化的、可测量的、可控制的，并可由组织进行分析，以监控OPM流程绩效。

(4) 级别4。量化管理的OPM。组织中的项目管理决策和流程管理是由数据驱动的。OPM流程绩效的管理方式能够实现量化改进目标。OPM流程绩效经过了系统性分析，以提高为组织增加价值的改进机会。

(5) 级别5。持续优化的OPM。组织稳定且专注于持续改进。OPM与组织战略的一致性，以及定义好的和可测量的价值贡献为关注点的OPM流程，促进了组织的敏捷和创新。在优化的组织中，已建立了有效的持续改进，以及一系列测量和度量指标。项目集和项目的成功率很好，项目组合经过优化以确保业务价值

试题27- 【2023年下半年-第27题】

采用较简单的流程、进行更多次测试和选用更可靠的卖方属于()策略。

- A.减轻 B.规避 C.上报 D.转移

【答案】A

【解析】P460，风险减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和影响。提前采取减轻措施通常比威胁出现后尝试进行弥补更加有效。减轻措施包括采用较简单的流程、进行更多次测试和选用更可靠的卖方。还可能涉及原型开发，以降低从实验台模型放大到实际工艺或产品中的风险。如果无法降低概率，也许可以从决定风险严重性的因素入手，来减轻风险发生的影响。例如，在一个系统中加入冗余部件，可减轻原始部件故障所造成的影响。

试题28- 【2023年下半年-第28题】

以下()不是迈克尔·波特提出的战略框架。

- A.差异性战略 B.总成本领先战略 C.专注战略 D.增长型战略

【答案】D

【解析】P96，见下图。描述业务战略的经典框架是迈克尔·波特提出的竞争力优势模型，如图4-3所示。

	客户认知的独特性	低成本地位
全行业范围	差异性战略	总成本领先战略
特定领域范围	专注战略	

图4-3 获得竞争力优势的三种战略

试题29- 【2023年下半年-第29题】

关于配置管理的说法中，错误的是()。

- A. 所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理，基本原则是：基线配置项向开发人员开放

读取的权限；非基线配置项向项目经理、CCB 及相关人员开放

B.可将配置项状态分为“草稿”“正式”和“修改”三种

C.由于我们不能保证新版本一定比旧版本“好”，所以不能抛弃旧版本

D.配置库可以分开发库、受控库、产品库、备份库4种类型

【答案】D

【解析】P558，配置库可以分开发库、受控库、产品库3种类型。

试题30- 【2023年下半年-第30题】

做出服务承诺，处处先为他人着想；关注他人的成长、学习、发展、自主性和福利；关注人际关系、团体与合作；服务优先于领导是（）

A.放任型

B.交易型

C.服务型

D.魅力型

【答案】C

【解析】P201，项目经理可以采用多种领导力风格，包括：①放任型(允许团队自主决策和设定目标，又被称为“无为而治型”)；②交易型(根据目标、反馈和成就给予奖励)；③服务型(做出服务承诺，处处先为他人着想；关注他人的成长、学习、发展、自主性和福利；关注人际关系、团体与合作；服务优先于领导)；④变革型(通过理想化特质和行为、鼓舞性激励、促进创新和创造，以及个人关怀提高追随者的能力)；⑤魅力型(能够激励他人；精神饱满、热情洋溢、充满自信；说服力强)；⑥交互型(结合了交易型、变革型和魅力型领导的特点)等。

试题31- 【2023年下半年-第31题】

以下（）不属于项目评估的依据。

A.项目建议书及其批准文件

B.项目可行性研究报告

C.报送组织的申请报告及主管部门的初审意见

D.项目章程

【答案】D

【解析】P234，项目评估的依据主要包括：①项目建议书及其批准文件；②项目可行性研究报告；③报送组织的申请报告及主管部门的初审意见；④项目关键建设条件和工程等的协议文件；⑤必需的其他文件和资料等。

试题32- 【2023年下半年-第32题】

以下（）属于控制质量的作用。

A.识别无效过程

B.使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态

C.提高实现质量目标的可能性

D.确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。

【答案】D

【解析】P368，管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。本过程的主要作用：①提高实现质量目标的可能性；②识别无效过程和导致质量低劣的原因；③使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。

P373，控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。本过程的主要作用：①核实项目可交付成果和工作已经达到主要

干系人的质量要求，可供最终验收；②确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。

试题33- 【2023年下半年-第33题】

以下关于数据安全法的说法中，错误的是()。

- A.数据安全法从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。
- B. 国家网信部门依照本法和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作
- C.国家建立数据分类分级保护制度，根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，对数据实行分类分级保护。国家数据安全工作协调机制统筹协调有关部门制定重要数据目录，加强对重要数据的保护。
- D.数据严禁交易，必须保密

【答案】D

【解析】国家建立健全数据交易管理制度，规范数据交易行为，培育数据交易市场。

试题34- 【2023年下半年-第34题】

以下关于网络安全法的说法中，错误的是()。

- A. 网络安全法的制定是为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展。适用于在中华人民共和国境内建设、运营、维护和使用的网络，以及网络安全的监督管理。
- B. 国家网信部门协调有关部门建立健全网络安全风险评估和应急工作机制，制定网络安全事件应急预案，并定期组织演练。
- C. 关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行2次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。
- D.采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月；

【答案】C

【解析】关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行1次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。

试题35- 【2023年下半年-第35题】

对于大型项目团队和主要通过虚拟方式工作的项目团队，则更适合采用()方法。

- A.预测型
- B.适应型
- C.混合型
- D.敏捷型

【答案】A

【解析】P530, 对于大型项目团队和主要通过虚拟方式工作的项目团队，则更适合采用预测型。

试题36- 【2023年下半年-第36题】

可交付物的范围稳定且变化小时，适合采用()方法。

- A. 预测型
- B. 适应型
- C.混合型
- D.敏捷型

【答案】A

【解析】P529, 可交付物的范围稳定且变化小时, 适合采用预测型方法

试题37- 【2023年下半年-第37题】

() 不是影响资源规划的事业环境因素。

- A.组织文化和结构
- B.设施和资源的物理分布
- C.现有资源的能力和可用性
- D. 物质资源管理政策和程序

【答案】D

【解析】P390, 事业环境因素: 能够影响规划资源管理过程的事业环境因素包括: 组织文化和结构; 设施和资源的物理分布; 现有资源的能力和可用性; 市场条件等。

组织过程资产: 能够影响规划资源管理过程的组织过程资产包括: 人力资源政策和程序; 物质资源管理政策和程序; 安全政策; 安保政策; 资源管理计划模板; 类似项目的历史信息等。

试题38- 【2023年下半年-第38题】

以下() 不是项目章程的内容。

- A. 项目目的
- B. 范围基准
- C.高层级需求
- D. 项目退出标准

【答案】B

【解析】P244, 项目章程记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息:
①项目目的; ②可测量的项目目标和相关的成功标准; ③高层级需求、高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果; ④整体项目风险; ⑤总体里程碑进度计划; ⑥预先批准的财务资源; ⑦关键干系人名单; ⑧项目审批要求(例如, 评价项目成功标准, 由谁对项目成功下结论, 由谁签署项目结束); ⑨项目退出标准(例如, 在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段); ⑩委派的项目经理及其职责和职权; ⑪发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权等。

试题39- 【2023年下半年-第39题】

以下() 不属于经济可行性研究的内容。

- A.支出分析
- B.收益分析
- C.投资回报分析
- D. 人员提升收益

【答案】D

【解析】P226, 经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析, 具体包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析以及敏感性分析等。

人员提升收益属于社会效益可行性分析。

试题40- 【2023年下半年-第40题】

项目组合管理绩效域包括项目组合生命周期、项目组合战略管理、项目组合治理、项目组合产能与能力管理、项目组合干系人参与、项目组合价值管理和()。

- A. 项目组合不确定性管理
- B. 项目组合规划管理
- C. 项目组合交付管理
- D.项目组合风险管理

【答案】D

【解析】P579, 项目组合管理绩效域包括项目组合生命周期、项目组合战略管理、项目组合治理、项目组合产能与能力管理、项目组合干系人参与、项目组合价值管理和项目组合风险管理。

试题41- 【2023年下半年-第41题】

以下() 属于启动过程组的内容。

A. 识别干系人 B. 规划进度管理 C. 范围确认 D. 成本预算

【答案】A

【解析】P220-221, 见下表。

10大管理	启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
项目干系人管理	①识别干系人	②规划干系人参与	③管理干系人参与	④监督干系人参与	

试题42- 【2023年下半年-第42题】

关于干系人参与度评估矩阵，以下说法，错误的是()。

- A. 干系人参与度评估矩阵：用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较
- B. C是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平(期望的)
- C. 支持型是指了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果
- D. 应根据每个干系人的当前与期望参与水平的差距，开展必要的沟通，有效引导干系人参与项目

【答案】B

【解析】P512, 干系人参与度评估矩阵：用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较
干系人参与水平可分为如下：

- ①不了解型：不知道项目及其潜在影响。
- ②抵制型：知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更。
- ③中立型：了解项目，但既不支持，也不反对。
- ④支持型：了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果。
- ⑤领导型：了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功。

C代表每个干系人的当前参与水平，而 D 是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平(期望的)。

试题43- 【2023年下半年-第43题】

确定合格供方的名单属于()。

- A. 规划采购 B. 实施采购 C. 控制采购 D. 识别干系人

【答案】B

【解析】P474, 项目采购管理过程包括：

- (1) 规划采购管理：记录项目采购决策、明确采购方法及识别潜在卖方。
- (2) 实施采购：获取卖方应答、选择卖方并授予合同。
- (3) 控制采购：管理采购关系、监督合同绩效、实施必要变更和纠偏，以及关闭合同。

试题44- 【2023年下半年-第44题】

以下关于问题解决，说法错误的是()。

- A. 问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。它包括收集其他信息、具有批判性思维的、创造性的、量化的和或逻辑性的解决方法。
- B. 问题可能在控制质量过程或质量审计中发现，也可能与过程或可交付成果有关。
- C. 问题解决通常包括以下要素：定义问题，识别根本原因，生成可能的解决方案，选择最佳解决方案，执行解决方案，验证解决方案的有效性等。
- D. 使用非结构化的问题解决有助于消除问题和制定长久有效的解决方案。

【答案】D

【解析】P372, 使用结构化的问题解决有助于消除问题和制定长久有效的解决方案。

试题45- 【2023年下半年-第45题】

准备开设一家计算机培训学校，他估计该项目投资需要20万，考虑到风险，他预留了10%的管理储备和5%的应急储备，则该项目的总预算为()。

- A.20 万 B.21 万 C.23 万 D.22 万

【答案】C

【解析】应急储备为 $20 \times 5\% = 1$ 万，管理储备为 $20 \times 10\% = 2$ 万。
总预算应急储备、管理储备都包含，所以总预算为 $20 + 1 + 2 = 23$ 万。

试题46- 【2023年下半年-第46题】

以下关于可行性研究的说法中，错误的是()。

- A. 将有项目时的成本(效益)与无项目时的成本(效益)进行比较叫做增量净效益法(有无比较法)
B. 可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等
C. 投资费用一般包括固定资金及流动资金两大部分，固定资金中又分为设计开发费、设备费、场地费、安装费及项目管理费等
D. 初步可行性研究必须用到增量净效益法

【答案】D

【解析】P230-231，初步可行性研究不是必须要用到。详细可行性研究可以用。

试题47- 【2023年下半年-第47题】

有效的度量指标具有SMART特征，其中T是指()。

- A. 具体的 B. 可实现的 C. 具有相关性 D. 具有及时性

【答案】D

【解析】P543，有效的度量指标具有SMART特征如下：

- S=Specific (具体的): 针对要度量的内容，度量指标是具体的。例如缺陷数量、已修复的缺陷和修复缺陷平均花费的时间等。
- M=Measurable (有意义的): 度量指标应与基准或需求相关。
- A=Attainable (可实现的): 在人员、技术和环境既定的情况下，目标是可以实现的。
- R=Relevant (具有相关性): 度量指标应具有相关性，度量结果应能带来价值，并且可付诸行动。
- T=Time-bound (具有及时性): 有用的度量指标具有及时性，新信息比旧信息有用，前瞻性信息(例如新趋势)可以帮助项目团队改变方向并更好地决策。

试题48- 【2023年下半年-第48题】

以下()不是交付绩效域需要重点关注的内容。

- A. 价值的交付 B. 可交付物 C. 质量 D. 范围

【答案】D

【解析】P540，在项目整个生命周期过程中，为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关注价值的交付、可交付物、质量。

试题49- 【2023年下半年-第49题】

()包括多种保密服务，为了防止网络中各系统之间的数据被截获或被非法存取而泄密，提供密码加密保护。

A.数据保密服务 B.对等实体认证服务 C.数据完整性服务 D.禁止否认服务

【答案】A

【解析】P173-P174，安全服务包括对等实体认证服务、数据保密服务、数据完整性服务、数据源点认证服务、禁止否认服务和犯罪证据提供服务等。

(1)对等实体认证服务。对等实体认证服务用于两个开放系统同等层中的实体建立链接或数据传输时，对对方实体的合法性、真实性进行确认，以防假冒。

(2)数据保密服务。数据保密服务包括多种保密服务，为了防止网络中各系统之间的数据被截获或被非法存取而泄密，提供密码加密保护。数据保密服务可提供链接方式和无链接方式两种数据保密，同时也可对用户可选字段的数据进行保护。

(3)数据完整性服务。数据完整性服务用以防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以及在数据交换过程中的数据丢失。

(4)数据源点认证服务。数据源点认证服务用于确保数据发自真正的源点，防止假冒。

(5)禁止否认服务。禁止否认服务用以防止发送方在发送数据后否认自己发送过此数据，接收方在收到数据后否认自己收到过此数据或伪造接收数据，由两种服务组成：不得否认发送和不得否认接收。

(6)犯罪证据提供服务。指为违反国内外法律法规的行为或活动，提供各类数字证据、信息线索等。

试题50- 【2023年下半年-第50题】

如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用()。

A.工料合同 B.总价合同 C.总承包合同 D.单价合同

【答案】A

【解析】P496，合同类型的选择：

①如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同；

②如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用工料合同；

③如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同；

④如果双方分担风险，则使用工料合同；如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同；如果卖方承担成本风险，则使用总价合同；

⑤如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同等。

试题51- 【2023年下半年-第51题】

在()规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次，它把可用于开展进度活动的时间段(按天或更小的时间单位)与不可用的时间段区分开来。

A.项目日历 B.资源日历 C.项目团队派工单 D.物质资源分配单

【答案】A

【解析】P324，在项目日历中规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次，它把可用于开展进度活动的时间段(按天或更小的时间单位)与不可用的时间段区分开来。

试题52- 【2023年下半年-第52题】

范围确认中，()关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。

A.项目管理人员 B.客户 C.项目团队成员 D.高层领导

【答案】B

【解析】P290-291，确认范围主要是项目干系人对项目的范围进行确认和接受的工作。每个人

对项目范围所关注的方面是不同的：

- (1) 管理层主要关注项目范围：是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围是否在投入产出上具有合理性。
- (2) 客户主要关注产品范围：关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。
- (3) 项目管理人员主要关注项目制约因素关心项目可交付成果是否足够和必须完成，时间、资金和资源是否足够，主要的潜在风险和预备解决的方法。
- (4) 项目团队成员主要关注项目范围中自己参与的元素和负责的元素通过定义范围中的时间检查自己的工作时间是否足够，自己在项目范围中是否有多项工作，而这些工作是否有冲突的地方。

试题53- 【2023年下半年-第53题】

以下说法中，错误的是（）。

- A. 自然语言处理 (Natural Language Processing,NLP) 是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向
- B. 从“人工+智能”向自主智能系统发展
- C. 专家系统其内部含有大量的某个领域专家水平的知识与经验，它能够应用人工智能技术和计算机技术，根据系统中的知识与经验，进行推理和判断
- D.神经网络是自然语言处理的一种形式

【答案】D

【解析】P61-63，神经网络是机器学习的一种形式。

试题54- 【2023年下半年-第54题】

以下关于审计证据的说法中，错误的是（）。

- A. 审计证据是指由审计机构和审计人员获取，用于确定所审计实体或数据是否遵循既定标准或目标，形成审计结论的证明材料
- B. 客观性是指审计证据必须是客观存在的事实材料。客观的审计证据比需要判断或解释的证据可靠
- C. 充分性是指要求审计人员根据所获证据足以对被审计对象提出一定程度保证的结论，是对审计证据数量的要求，主要与审计人员确定的样本量有关
- D.合法性是指审计证据与审计事项之间必须有实质性联系

【答案】D

【解析】P86，审计证据是指由审计机构和审计人员获取，用于确定所审计实体或数据是否遵循既定标准或目标，形成审计结论的证明材料。审计证据的特性见下表。

分类	说明
充分性	指要求审计人员根据所获得证据足以对被审计对象提出一定程度保证的结论，是对审计证据数量的要求，主要与审计人员确定的样本量有关
客观性	指审计证据必须是客观存在的事实材料。客观的审计证据比需要判断或解释的证据可靠
相关性	指审计证据与审计事项之间必须有实质性联系
可靠性	指审计证据能够反映和证实客观经济活动特征的程度。审计证据的可靠性受到审计证据的类型、取证的渠道和方法等因素的影响
合法性	指审计证据必须符合法定种类，并依照法定程序取得

试题55- 【2023年下半年-第55题】

()用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。

- A. 思维导图
- B. 干系人参与度评估矩阵
- C. 根本原因分析
- D. 优先级排序或分级

【答案】A

【解析】P512，思维导图：用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。

试题56- 【2023年下半年-第56题】

以下()不属于质量控制的输入。

- A. 可交付成果
- B. 工作绩效数据
- C. 测试与评估文件
- D. 质量控制测量结果

【答案】D

【解析】P374, D 是输出。

试题57- 【2023年下半年-第57题】

()是指事先确定项目的实物或团队资源

- A. 预分派
- B. 虚拟团队
- C. 集中办公
- D. 冲突管理

【答案】A

【解析】P398，预分派是指事先确定项目的实物或团队资源

试题58- 【2023年下半年-第58题】

以下关于云计算的说法中，错误的是()。

- A. 云计算是一种基于互联网的计算方式，实现了“快速、按需、弹性”的服务，用户可以随时通过宽带网络接入“云”并获得服务，按照需求获取或释放资源，对资源进行动态扩展
- B. PAAS 是向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务
- C. 云计算的关键技术主要涉及虚拟化技术、云存储技术、多租户和访问控制管理、云安全技术等
- D. 容器技术是一种全新意义上的虚拟化技术，属于操作系统虚拟化的范畴；也就是由操作系统提供虚拟化的支持。目前最受欢迎的容器环境是Docker

【答案】B

【解析】P51，云计算服务可以分为基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS) 和软件即服务(SaaS)。

(1) IaaS 向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。

(2) PaaS 向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web应用等平台化的服务。

(3) SaaS 向用户提供应用软件(如CRM、办公软件等)、组件、工作流等虚拟化软件的服务

试题59- 【2023年下半年-第59题】

以下关于气泡图的说法中，错误的是()。

- A. 气泡图能显示三维数据
- B. 在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡，并用x 轴值、y 轴值和气泡大小来表示风险的3个参数
- C. 气泡图中，可以用X 轴代表可监测性，Y 轴代表邻近性，影响值则以气泡大小表示
- D. 气泡图是识别风险的工具

【答案】D

【解析】P451, 气泡图能显示三维数据。在气泡图中, 把每个风险都绘制成一个气泡, 并用x轴值、y轴值和气泡大小来表示风险的3个参数。气泡图中X轴代表可监测性, Y轴代表邻近性, 影响值则以气泡大小表示。

试题60- 【2023年下半年-第60题】

敏感性分析的结果通常用()来表示。

- A. 气泡图 B. 龙卷风图 C. SWOT D. 概率影响矩阵

【答案】B

【解析】P455, 敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示。

试题61- 【2023年下半年-第61题】

以下()不是规划沟通管理的输入。

- A. 项目章程 B. 资源管理计划 C. 需求文件 D. 干系人参与度评估矩阵

【答案】D

【解析】P419, 干系人参与度评估矩阵是规划沟通管理的工具和技术。

试题62- 【2023年下半年-第62题】

随着项目进展和环境变化, 维持或提升干系人参与活动的效率和效果, 属于()。

- A. 识别干系人 B. 规划干系人 C. 管理干系人 D. 监督干系人

【答案】D

【解析】P504, 项目干系人管理的过程包括:

过程	过程定义	主要作用
1. 识别干系人	定期识别项目干系人, 分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程	使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注【在整个项目期间定期开展】
2. 规划干系人参与	根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响, 制定项目干系人参与项目的方法的过程	提供与干系人进行有效互动的可行计划【在整个项目期间定期开展】
3. 管理干系人参与	通过与干系人进行沟通协作, 以满足其需求与期望、处理问题, 并促进干系人合理参与的过程	尽可能提高干系人的支持度, 并降低干系人的抵制程度【在整个项目期间开展】
4. 监督干系人参与	监督项目干系人的关系, 并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程	随着项目进展和环境变化, 维持或提升干系人参与活动的效率和效果【在整个项目期间开展】

试题63- 【2023年下半年-第63题】

以下()不属于成本控制的内容。

- A. 对造成成本基准变更的因素施加影响
B. 防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更
C. 向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本
D. 确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准

【答案】D

【解析】P349, D 是成本预算的内容。项目成本控制的目标包括:

- ①对造成成本基准变更的因素施加影响;
②确保所有变更请求都得到及时处理;

- ③当变更实际发生时，管理这些变更；
- ④确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、WBS组件和活动分配的限额，也不超出项目总限额
- ⑤监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差；
- ⑥对照资金支出，监督工作绩效；
- ⑦防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更；
- ⑧向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本；
- ⑨设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内等。

试题64- 【2023年下半年-第64题】

数据标准化的主要内容不包含()。

- A.数据安全化标准 B. 数据元标准化 C. 元数据标准化 D. 数据标准化管理

【答案】 A

【解析】 P149， 数据标准化的主要内容包括元数据标准化、数据元标准化、数据模式标准化、数据分类与编码标准化和数据标准化管理。

试题65- 【2023年下半年-第65题】

适用于建设团队过程的人际关系与团队技能不包括()。

- A.冲突管理 B. 影响力 C. 团队建设 D. 虚拟团队

【答案】 D

【解析】 P402， 适用于建设团队过程的人际关系与团队技能主要包括：(1)冲突管理(2)影响力(3)激励(4)谈判(5)团队建设

试题66- 【2023年下半年-第66题】

范围管理中，需要裁剪的考虑因素不包括()。

- A.知识和需求管理 B. 确认和控制 C. 开发方法 D.WBS的结构

【答案】 D

【解析】 P274， 裁剪时应考虑的因素包括： (1) 知识和需求管理(2) 确认和控制(3) 开发方法(4) 需求的稳定性(5) 治理
