

第01章-信息化发展(3分)

1、两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，主要在技术、产品、()、产业四个方面进行融合。

- A.软件 B.网络 C.硬件 D.业务

【答案】D

【解析】P13, 信息化与工业化主要在技术、产品、业务、产业四个方面进行融合。

2、新型基础设施建设是以新发展理念为引领，以()为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要的基础设施体系。

- A.区块链 B.人工智能 C.技术创新 D.工业互联网

【答案】C

【解析】P7, 新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。自前，新型基础设施主要包括如下三个方面。江山老师

3、数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及组织核心业务，以新建一种()为目标的高层次转型。

- A.组织模式 B.评估模式 C.技术模式 D.业务模式

【答案】D

【解析】P28, 数字化转型 (Digital Transformation) 是建立在数字化转换 (Digitization)、数字化升级 (Digitalization) 基础上，进一步触及组织核心业务，以新建一种业务模式为目标的高层次转型

第02章-信息技术发展(3分)

4、关于信息安全的描述，不正确的是()。

A.网络安全技术主要包括防火墙、入侵检测与防护、VPN、安全扫描、网络蜜罐技术、用户和实体行为分析技术

B.随着物联网、云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术的广泛应用，信息安全面临着新的问题和挑战

C.信息安全可以划分为设备安全、数据安全、平台安全、行为安全四个层次

D.信息系统安全包括网络安全、操作系统安全、数据库系统安全和应用系统安全

【答案】C

【解析】P47, 信息必须依赖其存储、传输、处理及应用的载体(媒介)而存在，因此针对信息系统，安全可以划分为四个层次：设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。

信息系统一般由计算机系统、网络系统、操作系统、数据库系统 and 应用系统组成。与此对应，信息系统安全主要包括计算机设备安全、网络安全、操作系统安全、数据库系统安全和应用系统安全等。

网络安全技术主要包括：防火墙、入侵检测与防护、VPN、安全扫描、网络蜜罐技术、用户和实体行为分析技术等。

5、虚拟现实的关键技术不包括()。

- A.蒙特卡洛分析技术 B. 人机交互技术 C.传感器技术 D. 动态环境建模技术

【答案】A

【解析】P63，虚拟现实的关键技术主要涉及人机交互技术、传感器技术、动态环境建模技术和系统集成技术等。

6、()主要关注大数据存储、大数据协同和安全隐私等方面。

- A. 大数据获取技术 B.大数据可视化技术 C. 大数据处理技术 D. 大数据管理技术

【答案】D

【解析】P55-56，目前，大数据获取的研究主要集中在数据采集、整合和清洗三个方面。(A 选项错误)大数据的可视化技术主要集中在文本可视化技术、网络(图)可视化技术、时空数据可视化技术、多维数据可视化和交互可视化等。(B 选项错误)江山老师
分布式计算是随着分布式系统的发展而兴起的，其核心是将任务分解成许多小的部分，分配给多台计算机进行处理，通过并行工作的机制，达到节约整体计算时间，提高计算效率的目的。(选项C 错误)
大数据管理技术主要集中在大数据存储、大数据协同和安全隐私等方面。

第03章-信息系统治理(2分)

7、IT 审计业务和服务通常分为IT 内部控制审计和IT 专项审计，()属于IT内部控制审计。

- A.应用控制审计 B. 数据审计 C.网络与信息安全审计 D. 信息系统生命周期审计

【答案】A

【解析】P89,IT 审计业务和服务通常分为IT 内部控制审计和 IT 专项审计。IT 内部控制审计主要包括组织层面IT 控制审计、IT 一般控制审计及应用控制审计；IT 专项审计主要是指根据当前面临的特殊风险或者需求开展的 IT 审计，审计范围为IT 综合审计的某一个或几个部分。
组织层面 IT 控制审计主要指对 IT 战略、组织、架构、业务连续性、风险管理、外包管理、网络与信息安全及监督管理等进行审计
IT 一般控制审计主要是指针对与应用系统、数据库、操作系统、网络相关的策略和措施等进行审计
应用控制审计是指江针对山业务流程层面运行的人工或自动化程序进行审计，主要包括输入控制、处理控制和输出控制的审计
IT 专项审计包括：信息系统生命周期审计、信息系统开发过程审计、信息系统运行维护审计、网络与信息安全审计、信息系统项目审计、数据审计

8、IT治理活动的主要任务聚焦在全局统等，价值导向，机制保障，创新发展，文化助推五个方面。其中“指导建立规范过程管理和痕迹管理，并向利益相关者公开质量设定举措”属于()的内容。

- A. 机制保障 B. 创新发展 C. 价值导向 D. 全局统筹

【答案】A

【解析】P74，机制保障是指组织应对自身 IT 发展进行有效管控，保证 IT 需求与实现的协调发展，并使IT 安全和风险得到有效的识别、管理、防范和处置。组织需要建立适合组织特点的机制保障方法，满足疏漏互补、协同发展、监督改进和安全风险可控的原则，避免扭曲决策目标方向。组织需要明确管理责任，明晰上下左右权利关系，落实责任制和各项措施。组织可以根据相关法律法规、行业管理和上级监管机构发布的规范文件要求，制定本组织的信息技术治理制度并实施，重点聚焦在：江山老师①指导建立规范过程管理和痕迹管理，并向利益相关者公开质量设定举措；②评审 IT 管理体系的适宜性、充分性和有效性：③审计 IT 完整性、有效性和合规性；④监督由审计和管理评审，提出改进内容的实施。

第04章-信息管理系统管理(2分)

9、IT 审计常用的审计技术不包括()。

A. 产品分析技术 B. 审计抽样技术 C. 风险评估技术 D. 大数据审计技术

【答案】A

【解析】P84, 常用的 IT 审计技术包括风险评估技术、审计抽样技术、计算机辅助审计技术及大数据审计技术。产品分析技术是定义范围的工具技术。

10、信息系统的运维和服务中，IT 服务管理是通过主动管理和流程的持续改进来确保 IT 服务交付有效且高效的一组活动，Q 不属于IT 服务管理的活动。

A. 服务台 B.事件管理 C. 过程开发 D. 配置管理

【答案】C

【解析】P101,IT 服务管理是通过主动管理和流程的持续改进来确保 IT 服务交付有效且高效的一组活动。IT 服务管理由若干不同的活动组成：服务台、事件管理、问题管理、江山老师变更管理、配置管理、发布管理、服务级别管理、财务管理、容量管理、服务连续性管理和可用性管理。

第05章-信息系统工程(5分)

11、软件过程能力成熟度模型(CSMM) 包括治理、开发与交付、管理与支持、()四个能力域。

A.数据管理 B.组织管理 C. 战略管理 D.运营管理

【答案】B

【解析】P144, 软件过程能力是组织基于软件过程、技术、资源和人员能力达成业务目标的综合能力。包括治理能力、开发与交付能力、管理与支持能力、组织管理能力等方面。

12、信息安全管理CIA 三要素指的是()。

A.一致性、可用性、完整性 B.保密性、有效性、可用性

C. 一致性、可用性、有效性 D. 保密性、完整性、可用性

【答案】D

【解析】P125,CIA 三要素是保密性 (Confidentiality)、完整性(Integrity) 和可用性 (Availability) 三个词的缩写。

13、依据ISSE-CMM中公共特性的成熟度等级定义，()不属于ISSE-CMM 的 Level2: 规划和跟踪级。

A. 将过程域执行的方法形成标准化和程序化文档

B. 对组织的标准化过程族进行裁剪

C. 在执行过程域中，使用文档化的标准和程序

D. 验证过程与可用标准的一致性

【答案】B

【解析】P179, 规划执行

级别	公共特性	通用实施
Level1:非 正规实施级	执行基本实施	1. 1. 1执行过程
Level2:规 划和跟踪级	规划执行	2. 1. 1为执行过程域分配足够资源 2. 1. 2为开发工作产品和(或)提供过程域服务指定责任人 2. 1. 3将过程域执行的方法形成标准化和(或)程序化文档 2. 1. 4提供支持执行过程域的有关工具 2. 1. 5保证过程域执行人员获得适当的过程执行方面的培训 2. 1. 6对过程域的实施进行规划
	规范化执行	2. 2. 1在执行过程域中，使用文档化的规划、标准和(或)程序 2. 2. 2在需要的地方将过程域的工作产品置于版本控制和配置管理之不
	验证执行	2. 3. 1验证过程与可用标准和(或)程序的一致性 2. 3. 2审计工作产品(验证工作产品遵从可适用标准和(或)需求的情况)
	跟踪执行	2. 4. 1用测量跟踪过程域相对于规划的态势 2. 4. 2当进程严重偏离规划时采取必要修正措施
Level 3:充 分定义级	定义标准化 过程	3. 1. 1对过程进行标准化 3. 1. 2对组织的标准化过程族进行裁剪
	执行已定义 的过程	3. 2. 1在过程域的实施中使用充分定义的过程 3. 2. 2对过程域的适当工作产品进行缺陷评审 3. 2. 3通过使用已定义过程的数据管理该过程
	协调安全实施	3. 3. 1协调工程科目内部的沟通 3. 3. 2协调组织内不同组间的沟通 3. 3. 3协调与外部组间的沟通

14、()定位于在并发事务中保证数据库中数据的逻辑一致性。

- A.保证数据库的完整性
- B.保证数据的操作完整性
- C.保证数据的语义完整性
- D.防止非法的数据访问

【答案】B


【解析】P161, 保证数据的操作完整性定位于在并发事务中保证数据库中数据的逻辑一致性。一般而言，数据库管理系统中的并发管理器子系统负责实现这部分需求

15、在应用集成中，有多个组件帮助协调连接各种应用。其中()利用特定的数据结构，帮助开发人员快速访问其他应用的功能。

- A. 事件驱动型操作
- B.API
- C.数据映射
- D.RNN

【答案】B

【解析】P169, 应用编程接口(API):API 是定义不同软件交互方式的程序和规则，可以支持应用之间相互通信。API利用特定的数据结构，帮助开发人员快速访问其他应用的功能。

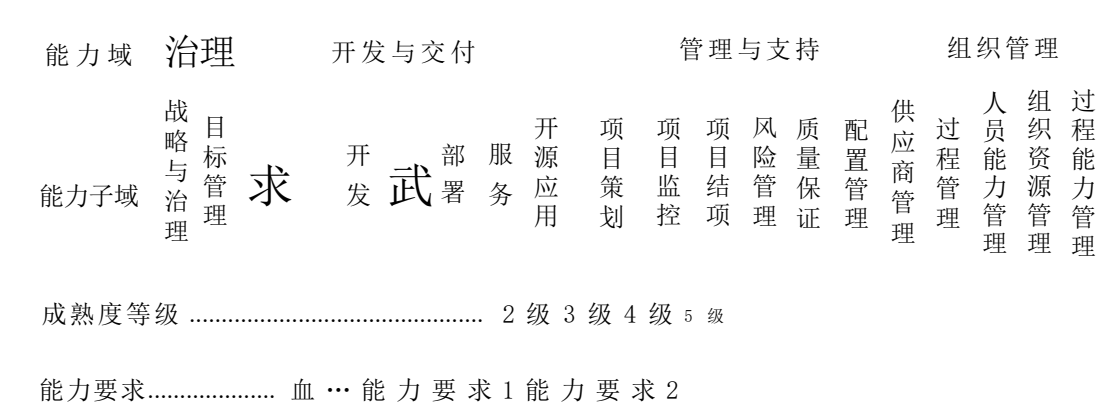

第06章-项目管理概论(2分)

16、关于项目经理的描述，不正确的是：()。

- A. 项目经理是发起人、团队成员与其他干系人之间的沟通者
- B.项目经理领导项目团队实现项目目标
- C. 项目经理应该时刻关注行业的最新发展趋势
- D.项目经理不可以是临时被委任的外部顾问

【答案】D

【解析】P196, 项目经理还承担项目发起人、团队成员与其他干系人之间的沟通者，可以提供指导和展示项目成功的愿景和目标。(A 选项正确) 江山老师

项目经理则由执行组织委派，负责领导团队实现项目目标。(B 选项正确)

项目经理应该时刻关注行业的最新发展趋势，获取并判断这些信息对当前项目的影响。(C 选项正确)

项目经理还需与其他角色紧密协作，如组织经理、专家以及可行性研究分析人员。在某些情况下，项目经理可以是临时被委任的外部顾问。(D 选项错误) 项目经理还可以担任非正式的宣传大使。

17、价值交付系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和信息流。其中，价值交付组件包括()。

①战略②项目组合③项目集④项目⑤运营⑥产品⑦市场环境

- A.②③④⑤⑥
- B.②③④⑥⑦
- C.①②③④⑤
- D.①②③④⑥

【答案】A

【解析】P221, 价值交付系统描述了项目如何在系统内运作，为组织及其干系人创造价值。价值交付系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和信息流。

可以单独或共同使用多种组件(例如项目组合、项目集、项目、产品和运营)以创造价值

第07章-立项管理(2分)

18、项目评估指在()的基础上，由()根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等条件下，进行评价、分析和论证。

- A.项目立项申请；项目承建方
- B.项目可行性研究；项目建设方
- C.项目立项申请；第三方
- D.项目可行性研究；第三方

【答案】 D

【解析】 P234， 项目评估指在项目可行性研究的基础上， 由第三方(国家、 银行或有关机构)根据国家颁布的政策、 法规、 方法、 参数和条例等， 从国民经济与社会、 组织业务等角度出发， 对拟建项目建设的必要性、 建设条件、 生产条件、 市场需求、 工程技术、 经济效益和社会效益等进行评价、 分析和论证， 进而判断其是否可行的一个评估过程。

19、 关于可行性研究的描述， 正确的是： ()。

- A. 试验室和中间工厂的试验是初步可行性研究的主要内容
- B. 详细可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后， 对项目进行的初步评估
- C. 初步可行性研究与详细可行性研究在占有资源和研究细节方面是相同的
- D. 辅助研究用于解决项目的核心问题， 为判断是否具备必要的技术、 实验、 人力条件提供支持

【答案】 D

【解析】 P84， 初步可行性研究的主要内容包括： 需求与市场预测、 设备与资源投入分析、 空间布局、 项目设计、 项目进度安排、 项目投资与成本估算(选项A错误)

初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后， 对项目进行的初步评估。(B 选项错误)

初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同。 所不同的是占有的资源、 研究细节方面有较大差异。(C 选项错误)

初步估计必须进行的辅助研究， 以解决项目的核心问题， 并判断是否具备必要的技术、 实验、 人力条件作为支持等。

第08章-整合管理(4分)

20、 能够影响“制订项目管理计划” 过程的组织过程资产包括()。

- ①组织的标准政策
- ②变更控制程序
- ③历史项目进度网络图
- ④特定行业的项目管理知识体系
- ⑤法律法规和安全标准
- ⑥历史信息和经验教训知识库

A.①②③⑥ B.①③⑤⑥ C.①③④⑥ D.①②④⑤

【答案】 A

【解析】 P246， 能够影响制订项目管理计划过程的组织过程资产主要包括： 组织的标准政策(①)、 流程和程序； 项目管理计划模板； 变更控制程序(②江山老师)， 包括修改正式的组织标准、 政策、 计划、 程序或项目文件， 以及批准和确认变更所须遵循的步骤； 监督和报告方法、 风险控制程序以及沟通要求； 以往类似项目的相关信息(如范围、 成本、 进度与绩效测量基准、 项目日历、 项目进度网络图(③)和风险登记册)； 历史信息和经验教训知识库(⑥)等。

21、 () 包括收到的变更请求的数量， 接受的变更请求的数量或者确认和完成的可交付成果的数量； 控制范围过程产生的() 包括收到的变更的分类、 识别的范围偏差和原因、 偏差对进度和成本的影响， 以及对将来范围绩效的预测。

- A. 工作绩效报告； 工作绩效信息 B. 工作绩效数据； 工作绩效信息
- C. 工作绩效信息； 工作绩效报告 D. 工作绩效数据； 工作绩效报告

【答案】 B

【解析】 P328， 工作绩效数据可能包括收到的变更请求的数量， 接受的变更请求的数量或者核实、 确认和完成的可交付成果的数量。

控制范围过程产生的工作绩效信息是有关项目和产品范围实施情况(对照范围基准)的相互关联且与各种背景相结合的信息， 包括收到的变更的分类、 识别的范围偏差和原因、 偏差对进度和成本的影响， 以及对将来范围绩效的预测。

工作绩效报告是为制定决策、 采取行动或引起关注所形成的实物或电子工作绩效信息， 无它包括从进度控制、 车

成本控制、质量控制和范围确认中得到的结果，有助于项目团队管理。绩效报告和相关预测报告中的信息，有助于确定未来的团队资源需求、认可与奖励，以及更新资源管理计划。

22、项目整合管理过程中，“实施已批准的变更”在()过程中开展。

- A. 指导与管理项目工作 B. 监控项目工作 C. 制订项目管理计划 D. 实施整体变更控制

【答案】 A

【解析】 P251， 指导与管理项目工作还要求项目团队回顾所有项目要界的影响，并实施已批准的变更，包括纠正措施、预防措施和缺陷补救措施。江山老师

23、监控项目工作过程中，出现偏差时，需使用()在多个方案中选择要执行的纠正措施和预防措施；需使用()技术确定最节约成本的纠正措施；需使用()技术对范围、进度和成本绩效进行综合分析。

- A.偏差分析；备选方案分析；成本效益分析
B. 备选方案分析；成本效益分析；挣值分析
C. 备选方案分析；偏差分析；成本效益分析
D. 偏差分析；备选方案分析；挣值分析

【答案】 B

【解析】 P260， 备选方案分析：用于在出现偏差时选择要执行的纠正措施或纠正措施和预防措施的组合。
成本效益分析：有助于出现偏差时确定最节约成本的纠正措施。
挣值分析：对范围、进度和成本绩效进行了综合分析。
偏差分析：在监控项目工作过程中，通过偏差分析对成本、时间、技术和资源偏差进行综合分析，以了解项目的总体偏差情况。这样就便于采取合适的预防或纠正措施。

第09章- 范围管理(2分)

24、项目范围说明书包括()。

- ①产品范围描述
②需求跟踪矩阵
③项目的除外责任
④干系人登记册
⑤可交付成果
⑥验收标准
- A.①②④⑥ B.①③⑤⑥ C.①②③⑤ D.①②⑤⑥

【答案】 B

【解析】 P284， 项目范围说明书包括内容有：产品范围描述、可交付成果、验收标准、项目的除外责任

25、关于范围管理的描述，正确的是：()。

- A. 定义范围管理是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程
B. 范围管理计划包含配置管理活动和需求优先级排序过程
C. 范围管理计划是非常详细的正式的计划
D. 规划范围管理的作用是在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向

【答案】 D

【解析】 P275， 规划范围管理是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程 (A 选项)。本过程的主要作用是在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向 (D 选项)。
范围管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。范围管理计划用于指导如下过程和相关工作：制定项目范围说明书；根据详细项目范围说明书创建 WBS;确定如何审批和维护范围基准；正式验收已完成的项目可交付成果。配置管理活动和需求优先级排序过程属于需求管理计划的内容 (B 选项江山老师)。
根据项目需要，范围管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的 (C 选项)。综上所述，本题参考答案为D 选项。

第10章-进度管理(4分)

26、()不属于排列活动顺序过程的工具与技术。

- A. 关键路径法 B. 提前量和滞后量 C. 紧前关系绘图法 D. 箭线图法

【答案】A

【解析】P305, 排列活动顺序过程的工具与技术: 紧前关系绘图法、箭线图法、确定和整合依赖关系、提前量和滞后量、项目管理信息系统。

关键路径法为制订进度计划、控制进度过程的工具与技术

27、关于定义活动过程的描述, 不正确的是: ()。

- A. 定义活动主要由项目经理主导, 也需要其他项目团队成员参与
B. 定义活动完成后, 应形成一份详细的活动清单
C. 定义活动输出的里程碑清单是合同要求的强制性的的重要时间节点和事件
D. 定义活动过程中必须考虑项目的时间限制和预算约束

【答案】C

【解析】P305, 里程碑是项目中的重要时点或事件, 里程碑清单列出了项目所有的里程碑, 并指明每个里程碑是强制性的(如合同要求的)还是选择性的(江山老师如根据历史信息确定的)。里程碑的持续时间为零, 因为它们代表的只是一个重要时间点或事件。(C 选项错误)

28、可用于控制进度过程的数据分析技术不包括: ()。

- A. 备选方案分析 B. 偏差分析 C. 迭代燃尽图 D. 趋势分析

【答案】A

【解析】P328, 可用作控制进度过程的数据分析技术主要包括: 挣值分析、迭代燃尽图、绩效审查、趋势分析、偏差分析、假设情景分析。

备选方案分析是规划进度管理的数据分析技术。

29、在一个复杂的信息系统项目中, 由于资源限制, 项目经理发现关键资源(如资深开发人员)经常在不同的项目任务之间被重新分配, 这导致项目进度频繁延误和质量波动。为了有效控制资源并减少对进度延迟和成本超支的影响, 项目经理优先采取的措施是()。

- A. 增加资源储备以应对未来的资源需求波动
B. 严格限制资源在项目间的共享, 确保资源专注于当前任务
C. 实施资源平衡策略, 优化不同任务间的资源分配
D. 缩减项目范围以匹配可用资源的能力

【答案】C

【解析】P319, 资源平衡是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡, 根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术。如果共享资源或关键资源只在特定时间可用而且数量有限, 如一个资源在同一段内被分配至两个或多个活动, 就需要进行资源平衡。也可以为保持资源使用量处于均衡水平而进行资源平衡。

第11章-成本管理(3分)

30、关于成本管理的描述, 不正确的是()。

A. 在项目过程中, 不应只关心完成项目活动所需资源的成本, 也需考虑项目决策对项目最终产品的使用和维护成本的影响

B. 成本估算和成本预算是两个过程, 即使是很小的项目, 也需要由不同的人员来分别完成, 以保证估算和预算过程的客观性和独立性

C. 全生命周期成本管理经常与价值工程技术结合使用, 用于降低成本, 缩短时间, 提高项目可交付成果的质量和绩效, 并优化决策过程

D. 项目成本管理应当考虑项目干系人的需要, 不同的项目干系人可能在不同的时间以不同的方式测算项目的成本

【答案】B

【解析】P334, 生命期成本管理经常与价值工程技术结合使用, 用于降低成本, 缩短时间, 提高项目可交付成果的质量和绩效, 并优化决策过程。

项目成本管理应当考虑项目干系人的需要, 不同的项目干系人可能在不同的时间以不同的方式测算项目的成本。例如, 物品的采购成本可以在做出承诺、发出订单、送达、货物交付时, 实际成本发生时或者为了会计核算的目的记录实际成本时, 再进行测算。

就某些项目, 特别是小项目而言, 成本估算和成本预算之间的关系极其密切, 以致可以将其视为一个过程, 由一个人在较短的时间内完成。

31、成本管理计划中通常不会规定()。

- A. 准确度 B. 控制临界值 C. 精确度 D. 薪酬结构

【答案】D

【解析】P340, 在成本管理计划中一般需要规定: 计量单位、精确度、准确度、组织程序链接、控制临界值、绩效测量规则、报告格式、其他细节。

32、关于制定预算的描述, 不正确的是: ()。

- A. 项目预算包括经批准用于执行项目的全部资金
B. 成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算
C. 制定预算过程的主要作用是确定项目所需资金
D. 制定预算是在汇总所有单个活动或工作包的估算成本, 建立一个经批准的成本基准的过程

【答案】C

【解析】P341, 制定预算的主要作用是, 确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准。估算成本的主要作用是确定项目所需的资金。C选项的说法有误。

第12章-质量管理(3分)

33、在执行质量管理相关过程时, 质量经理对提交的成果进行了审查, 将发现的问题记录并给出了纠正措施建议, 该质量经理正在执行()过程。

- A. 控制质量 B. 管理质量 C. 规划质量管理 D. 持续改进

【答案】A

【解析】P373, 控制质量是为了评估绩效, 确保项目输出完整、正确且满足客户期望, 而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。

本过程的主要作用: ①核实项目可交付成果和工作已经达到主要干系人的质量要求, 可供最终验收; ②确定项目输出是否达到预期目的, 这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。

34、关于“管理质量”过程的描述, 不正确的是: ()。

- A. 管理质量是把组织的质量政策用于项目, 并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程
B. 管理质量是所有人的共同职责, 包括项目经理、项目团队、项目发起人、执行组织的管理层
C. 管理质量包括所有质量保证活动, 与产品设计和过程改进无关
D. 管理质量过程需要在整个项目期间开展

【答案】C

【解析】P368, 管理质量包括所有质量保证活动, 还与产品设计和过程改进有关。C选项的说法错误。

35、常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具是PDCA 和 ()。

- A. 流程图 B. 六西格玛 C. 决策树分析 D. 蒙特卡洛模拟

【答案】B

【解析】P372, 质量改进的开展, 可基于质量控制过程的发现和建议、质量审计的发现或管理质量过程的问题解决。计划—实施—检查—行动和六西格玛是最常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具。

第13章-资源管理(2分)

36、由于每个项目都是独特的，项目经理可以根据需要对项目资源管理过程进行裁剪。裁剪时考虑的因素不包括()。

- A.物理位置 B.团队管理 C.沟通技术 D.生命周期方法

【答案】C

【解析】P388, 由于每个项目都是独特的，项目经理可以根据需要对项目资源管理过程进行裁剪。裁剪时应考虑的因素包括：多元化、物理位置、行业特定资源、团队成员的获得、团队管理、生命周期方法

37、在获取资源过程中，()情况下不需要采用预分派。

- A.项目需要采购外部资源
B.在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作
C.在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作
D.项目取决于特定人员的专有技能

【答案】A

【解析】P398, 预分派指事先确定项目的实物或团队资源，在如下情况时可采用预分派：①在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；②项目取决于特定人员的专有技能；③江山老师在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作。

第14章-沟通管理(3分)

38、“监督沟通”过程采用的措施不包括()。

- A.整理经验教训、开展团队观察 B.审查问题日志、评估变更
C.开展客户满意度调查 D.识别和确定沟通需求

【答案】D

【解析】P427, 监督沟通可能需要采取各种方法，例如，开展客户满意度调查、整理经验教训、开展团队观察、审查问题日志和评估变更

39、项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、分发、()和处理项目信息所需的过程。

- A.存储 B.分析 C.接收 D.分享

【答案】A

【解析】P414, 项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、分发、存储和最终处理项目信息所需的过程。(A选项)

项目沟通管理过程揭示了实现成功沟通所需的人员、观点、信息这三项要素之间的一种联络关系。项目经理需要花费大量且无规律的时间，用于与项目团队、项目干系人、客户和赞助商沟通。项目中的每一成员也需要了解沟通对项目的影响。

40、在一个大型信息系统项目中，项目经理发现尽管已经建立了沟通机制，但团队间的沟通依然不顺畅，项目风险不断上升。项目经理应优先采取的措施是()。

- A.监督沟通活动执行情况，审查并优化现有沟通机制
B.引入新的沟通工具，提高信息传递效率
C.增加每周的团队会议次数，强制团队成员交流
D.对团队成员进行沟通技巧培训，提升沟通质量

【答案】A

【解析】在此情况下，优先采取的措施应该是监督沟通活动执行情况，审查并优化现有沟通机制。

因为项目经理需要了解沟通活动是否按照计划执行，确保团队成员之间的沟通得到有效落实，并审查目前使用的沟通机制，包括沟通工具和流程。监督可以帮助识别问题，并及早采取纠正措施。

审查，可以确定是否存在问题，以及如何改进和优化现有的沟通机制。

以更好地满足团队成员之间的沟通需求。

增加沟通工具或者强制团队成员交流不一定是解决问题的最佳方式。在没有审查和优化现有者毒邁新制之备辅导

引入新的沟通工具可能会增加混乱和复杂性。强制团队成员交流也可能导致压力和抵触情绪，反而影响沟通质量。

在优化现有沟通机制之后，如果团队成员仍然存在沟通技巧不足的问题，才考虑对团队成员进行沟通技巧培训，以提升沟通质量。但在当前情况下，优先解决沟通机制上的问题更为重要。

第15章-风险管理(3分)

41、在项目执行过程中，项目经理发现项目进展顺利，但某些潜在风险因素仍然存在。为了确保项目能够顺利完成，项目经理应采取()措施，有双地监督这些风险。

- A. 定期进行风险审查会议，并更新风险登记册
- B. 减少项目开支，以降低潜在风险的影响
- C. 分析风险因素对项目的潜在影响，并调整项目计划
- D. 增加项目预算，以应对可能出现的风险

【答案】A

【解析】P467，适用于监督风险过程的会议是风险审查会。江应山该定期安排风险审查，来检查和记录风险应对在处理整体项目风险和已识别单个项目风险方面的有效性。在风险审查中，江山老师还可以识别出新的单个项目风险(包括已商定应对措施所引发的次生风险)、重新评估当前风险、关闭已过时风险、讨论风险发生所引发的问题，以及总结可用于当前项目后续阶段或未来类似项目的经验教训。综上，选择A 选项。

42、在一个大型项目实施过程中，项目经理发现项目风险已经发生，并且对项目进度和成本产生了显著影响。为了准确评估风险对项目目标的影响程度，项目经理应该采取的定量风险分析技术是())。

- A. 风险分类
- B. 风险数据质量评估
- C. 风险概率和影响评估
- D. 敏感性分析

【答案】D

【解析】P455，用于实施风险定性分析的工具与技术有：专家判断、访谈、风险数据质量评估、风险概率和影响评估、其他风险参数评估、引导、风险分类、概率和影响矩阵、层级图、会议。

用于实施风险定量分析的工具与技术有：专家判断、访谈、引导、不确定性表现方式、模拟、敏感性分析、决策树分析、影响图。

43、关于规划风险管理过程的描述，不正确的是：()。

- A. 规划风险管理在项目实施阶段开始，并在项目执行期间持续进行
- B. 规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程
- C. 规划风险管理的主要作用是确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度相匹配
- D. 干系人分析法可用于规划风险管理过程

【答案】A

【解析】P439，规划风险管理过程在项目立项阶段就应开始，并在项目早期完成。

第16章-采购管理(3分)

44、关于采购合同的描述，不正确的是：()。

- A. 项目经理应确保采购合同的变更管理遵循组织的变更管理流程，以确保合同变更的合规性和有效性
- B. 项目经理无需对采购合同进行定期审查，因为合同条款一旦确定就不会发生变化
- C. 采购合同应明确规定项目的验收标准和方法，以确保交付成果符合项目要求
- D. 合同中的违约责任条款是为了在发生违约情况时，双方能够依据合同条款进行纠纷解决

【答案】B

【解析】P498，项目的建设过程中难免出现一些不可预见的事项，包括要求修改或变更合同条款的情况，例如，改变系统的功能、开发进度、成本支付及双方各自承担的责任等。一般在合同订立之后，江山老师引起项目范围、合同有关各方权利责任关系变化的事件，均可以看作是合同变更。

45、在控制采购过程中，项目经理发现某些供应商提供的产品存在质量问题，并且这些问题可能导致项目延期。项目经理应()。

- A.立即终止与存在问题的供应商合作，并寻找新的供应商
- B.自行决定采取补救措施，如增加项目预算或延长项目工期，以弥补供应商的问题
- C.首先与供应商沟通，了解问题的原因，并尝试解决或减轻其对项目的影响
- D.通知高层领导，并等待高层领导的决策后再采取行动

【答案】C

【解析】出现问题优先是需要想办法解决问题。

46、在确定项目合同类型时，如果工作性质清楚，但工作量不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同。这种情况下建议使用()。

- A.成本加激励费用合同
- B.总价合同
- C.成本补偿合同
- D.工料合同

【答案】D

【解析】P496，在项目工作中，要根据项目的实际情况和外界条件的约束来选择合同类型：

- ①如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同；
- ②如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用工料合同；(D选项)
- ③如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同；
- ④如果双方分担风险，则使用工料合同；如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同；如果卖方承担成本风险，则使用总价合同；
- ⑤如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同等。

第17章-干系人管理(3分)

47、关于干系人参与计划的描述，不正确的是：()。

- A.干系人参与计划是项目管理计划的组成部分
- B.干系人参与计划基于项目的需要和干系人的期望而制定
- C.干系人参与计划是识别干系人过程的输出
- D.干系人参与计划制订了干系人有效参与和执行项目决策的策略和行动

【答案】C

【解析】P512，干系人参与计划是项目管理计划的组成部分(A选项)。

该计划制订了干系人有效参与和执行项目决策的策略和行动(D选项)。

干系人参与计划可以是正式的或非正式的，非常详细的或高度概括的，这基于项目的需要和干系人的期望(B选项)。

干系人参与计划是规划干系人参与的输出(C选项)。

48、项目经理根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法，则该项目经理正在执行()过程。

- A.识别干系人
- B.规划干系人参与
- C.管理干系人参与
- D.监督干系人参与

【答案】B

【解析】P504，项目干系人管理的过程包括：

- 识别干系人：定期识别干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目潜在的影响。
- 规划干系人参与：根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法。
- 管理干系人参与：与干系人进行沟通和协作，以满足其需求与期望，并处理问题，以促进干系人合理参与。
- 监督干系人参与：监督项目干系人关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目。

49、监督干系人参与时，()用于确定干系人群体和个人在项目任何特定时间的状态。

- A.根本原因分析
 - B.优先级排序
 - C.职责分配矩阵
 - D.干系人分析
- 【答案】D

【解析】P516，适用于监督干系人参与过程的数据分析技术主要包括：

- 备选方案分析：在干系人参与效果没有达到期望要求时，应该开展备选方案分析，评估应对偏差的各种备选方案。
- 根本原因分析：开展根本原因分析，确定干系人参与未达预期效果的根本原因 (A 选项)。
- 干系人分析：确定干系人群体和个人在项目任何特定时间的状态(D 选项)。
- 优先级排序：如果项目有大量干系人、干系人群体的成员频繁变化、干系人和项目团队之间或干系人群体内部的关系复杂，则有必要对干系人进行优先级排序 (B 选项)。
- 职责分配矩阵 (RAM)，它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清 (C 选项)。

第18章-项目绩效域(3分)

50、交付绩效域的绩效要点包括 ()。

①质量②成本③风险④可交付物⑤价值的交付

- A.①②③ B.②③④ C.①④⑤ D.②④⑤

【答案】C

【解析】P540，在项目整个生命周期过程中，为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关注价值的交付、可交付物、质量。

51、有效执行规划绩效域，能够达到的目标不包括： ()。

- A.项目以有条理、协调一致的方式推进
- B.可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整
- C.对实物资源进行了有效管理
- D.以系统的方法交付项目成果

【答案】C

【解析】P532，在项目整个生命周期过程中，有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：①项目以有条理、协调一致的方式推进 (A 选项)；②应用系统的方法交付项目成果(D 选项)；③对演变情况进行详细说明；④规划投入的时间成本是适当的；⑤规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的；⑥可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整 (B 选项)。

在项目整个生命周期过程中，为了有效执行规划绩效域，项目经理需要重点关注：规划的影响因素、项目估算、项目团队组成和结构规划、沟通规划、实物资源规划(C 选项)、采购规划、变更规划、度量指标和一致性。综上所述，本题参考答案为C 选项。

52、探索各种选项，权衡包括时间与成本、风险与进度等多种因素，舍弃无效或次优的替代方案，这种不确定性应对方法是 ()。

- A.增加韧性 B. 为多种结果做好准备 C.收集信息 D.集合设计

【答案】D

【解析】P552，项目中必然存在不确定性，任何活动的影响都无法准确预测，而且可能会产生一系列的不确定性。针对不确定性的应对方法主要包括：

- (1) 收集信息。可以对信息收集和分析工作进行规划，以便发现更多信息(江山老师如进行研究、争取专家参与或进行市场分析)来减少不确定性。
- (2) 为多种结果做好准备。制定可用的解决方案，包括备份或应急计划，为每一个不确定性做好准备。如果存在大量潜在不确定性，项目团队需要对潜在原因进行分类和评估，估算其发生的可能性。
- (3) 集合设计。探索各种选项，来权衡包括时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质量等多种因素，在整个过程中，舍弃无效或次优的替代方案，以便项目团队能够从各种备选方案中选择最佳方案。
- (4) 增加韧性。韧性是对意外变化快速适应和应对的能力，韧性既适用于项目团队成员，也适用于组织过程。如果对产品设计的初始方法或原型无效，则项目团队和组织需要能够快速学习、适应和应对变化。

第19章-配置与变更管理(2分)

53、关于配置审计的描述，不正确的是：。

- A. 审计软件即使发现不一致的情况，也不允许自动更新配置库或配置管理数据库，必须由有关负责人调查后再进行更新
- B. 配置审计也称配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计
- C. 功能配置审计是审计配置项的完整性，物理配置审计是审计配置项的一致性
- D. 验证配置项的开发已圆满完成属于功能配置审计

【答案】C

【解析】P564。但要注意的是，审计软件即使发现不一致的情况，也不允许自动更新配置库或配置管理数据库，必须由有关负责人调查后再进行更新。(A 选项正确)

配置审计也称配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计，分别用以验证当前配置项的一致性和完整性。(B 选项正确)

(1) 功能配置审计。功能配置审计是审计配置项的一致性(江山老师配置项的实际功效是否与其需求一致)，具体验证主要包括：①配置项的开发已圆满完成 (D 选项正确)；②配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征；③配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等。

(2) 物理配置审计。物理配置审计是审计配置项的完整性(配置项的物理存在是否与预期一致)，具体验证主要包括：①要交付的配置项是否存在；②配置项中是否包含了所有必需的项目等。

54、对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。不属于开发文档的是()。

- A. 软件集成计划
- B. 安全和测试信息
- C. 配置管理计划
- D. 可行性研究报告

【答案】C

【解析】P569, 信息系统项目类型的不同，其文档分类的方法不同，不同的组织也会结合自身的管理实践，定义其文档类型。对于信息系统开发项目来说，江其山文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。

(1) 开发文档描述开发过程本身，基本的开发文档包括：可行性研究报告、(D 选项)和项目任务书、需求规格说明、功能规格说明、设计规格说明(包括程序和数据规格说明、开发计划、软件集成和测试计划(A 选项)、质量保证计划、安全和测试信息(B选项)等)。

(2) 产品文档描述开发过程的产物，基本的产品文档包括：培训手册、参考手册和用户指南、软件支持手册、产品手册和信息广告。

(3) 管理文档记录项目管理的信息，例如：开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录；软件变更情况的记录；开发团队的职责定义、项目计划、项目阶段报告；配置管理计划 (C 选项)。

第20章-高级项目管理(3分)

55、项目组合生命周期由()4个阶段组成。

- A. 规划、执行、监控、收尾
- B. 规划、执行、监控、改进
- C. 启动、规划、执行、收尾
- D. 启动、规划、执行、优化

【答案】D

【解析】P579，项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化4个阶段组成。

56、OPM 框架的关键要素包括：()。

- A. OPM战略、OPM方法论、知识管理和人才管理
- B. OPM战略、OPM方法论、风险管理和人才管理
- C. OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和人才管理
- D. OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和风险管理

【答案】C

【解析】P584,OPM框架的关键要素包括：OPM治理、OPM 方法论、知识管理和人才管理。

57、CMMI 的4大能力域类别中，()用于生产和提供优秀解决方案。
A.提高 (Improving) B. 管理 (Managing) C.实现 (Enabling) D. 行动 (Doing)

- 【答案】 D
- 【解析】 P598,CMMI 将所有收集并论证过的最佳实践按逻辑归为4大能力域类别：
- 行动 (Doing): 用于生产和提供优秀解决方案的能力域。
 - 管理 (Managing): 用于策划和管理解决方案实施的能力域。
 - 使能 (Enabling): 用于支持解决方案实施和交付的能力域。
 - 提高 (Improving): 用于维持和提高效率效能的能力域。

第21章-项目管理科学基础(5分)

58、投资100万，年利率10%，按复利法计算，则3年后本利和约为()万元。
A.133 B.121 C.135 D.130

- 【答案】 A
- 【解析】 P609， 复利法按上一期的本利和计息，除本金计息外，利息也生利息，每一计息周期的利息都要并入下一期的本金，再计利息。复利计算公式为 $F_i=P(1+i)^n$ 。

年份	本金	当年利息	本利和
1	1 0 0 万	$100*10\%=10$	$100+10=110$
2	1 0 0 万	$110*10\%=11$	$110+11=121$
3	100万	$121*10\%=12.1$	$121+12.1=133.1$

59、某项目有四个方案均能满足要求。其费用数据如下表所示。在基准折现率为10%情况下，根据费用现值法，最优方案是()。

方案	总投资(第1年初)	每年运营费用(第1年到第3年)
方案乙	150	40
方案乙	300	5
方案丙	200	15
方案丁	250	10

- A. 丙 B. 丁 C. 乙 D. 甲
- 【答案】 A
- 【解析】 P614， 费用现值是不同方案在计算期内的各年成本，按基准收益率换算到基准年的现值与方案的总投资现值的和。费用现值越小，其方案经济效益越好。

$$PC = \sum_{t=0}^n CO_t(P/F, i_0, t) = \sum_{t=0}^n (K + C - S_v - W)_t(P/F, i_0, t)$$

$PC=150+40/(1+0.1)+40/(1+0.1)^2+40/(1+0.1)^3=249.47$

$PC=300+5/(1+0.1)+5/(1+0.1)^2+5/(1+0.1)^3=312.43$

$PC_{丙}=200+15/(1+0.1)+15/(1+0.1)^2+15/(1+0.1)^3=237.3$

$PC_j=250+10/(1+0.1)+10/(1+0.1)^2+10/(1+0.1)^3=274.86$

60、两家企业生产同种产品，为抢占市场规模，每家企业都制定了三个市场推销策略。两家企业的市场策略会影响双方的市场规模占有情况，赢得矩阵如下：

	乙企业策略1	乙企业策略2	乙企业策略3
甲企业策略1	-2	-1	3
甲企业策略2	1	0	1
甲企业策略3	3	-1	-3

在这个矩阵中，每个单元格中的数字表示甲企业比乙企业多占的市场规模，负数则表示甲企业比乙企业少占的市场规模。则双方各应采用哪种策略(。

- A.甲企业选择策略2, 乙企业选择策略2 B.甲企业选择策略1, 乙企业选择策略2忧 考 培 网 络 辅 导
- C. 甲企业选择策略1, 乙企业选择策略3 D. 甲企业选择策略3, 乙企业选择策略1

【答案】 A

【解析】 本题考查博弈论。

	乙企业策略1	乙企业策略2	乙企业策略3	MinMax
甲企业策略1	-2	-1	3	-2
甲企业策略2	1	0	1	0
甲企业策略3	3	-1	-3	-3
MinMax	3	0	3	

61、某公司承接一智能会议信息系统项目，有4个方案可供选择。每个方案都可能会出现三种不同的结果，分别对应获取不同的利润，如下表所示。根据悔值决策法，该公司应选择方案()。

	最差结果	一般结果	最佳结果
方案甲	-5万	15万	3 0 万
方案乙	10万	60万	80万
方案丙	2 0 万	35万	45万
方案丁	-60万	10万	50万

A. 丙 B. 丁 C. 甲 D. 乙

【答案】 D

【解析】 P636, 悔值决策法是对悲观决策法的一种修正，目的是使得保守程度少一些。

所谓悔值是指：若当某一状态出现时，对应这一状态的最优策略就可知。如果决策者当初没有采取这一方案，而是采取其他方案，这时会觉得后悔，因此对某状态B， 的最优方案的结果值与各方案的结果值 V, 有一个差额。这个差额被称为悔值，而悔值决策法就是计算在各种自然状态下的悔值，经过比较，从最大的悔值中选出最小的悔值。

后悔值表：

	最差结果	一般结果	最佳结果	后 悔 值 max
方案甲	25万	45万	5 0 万	50万
方案乙	1 0 万	0 万	0万	1 0 万
方案丙	0 万	25万	3 5 万	3 5 万
方案丁	8 0 万	5 0 万	3 0 万	8 0 万

综上，选择方案乙，D选项。

62、某项目有4个硬件的生产任务需要完成，有4个硬件厂商可选择，每个厂商只能分配一个任务。下表是各厂商完成各硬件生产所需的时间：

	硬件1	硬件2	硬件3	硬件4
厂商甲	13	6	8	9
厂商乙	6	11	5	8
厂商丙	7	9	5	8
厂商丁	8	6	7	12

则4个硬件生产完成的总时间最短为()。

A.26 B.25 C.28 D.27

【答案】 A

【解析】 本题考查匈牙利算法。

1、首先找出每行的最小值，然后该行每个数值都减去这个数，得到一个矩阵。

	硬件1	硬件2	硬件3	硬件4
厂商甲	7	0	2	3
厂商乙	1	6	0	3
厂商丙	2	4	0	3
厂商丁	2	0	1	6

2、在上面的矩阵中，再找出每列的最小值，然后该列每个数值都减去这个数，又可以得到一个矩阵。

	硬件1	硬件2	硬件3	硬件4
厂商甲	6	0	2	0
厂商乙	0	6	0	0
厂商丙	①	4	0	0
厂商丁	1	0	1	3

3、在第2步所得的矩阵中，0即为可以安排的对应工作。

	硬件1	硬件2	硬件3	硬件4
厂商甲	6	0	2	0
厂商乙	0	6	0	0
厂商丙	1	4	0	0
厂商丁	1	0	1	3

因此丁做硬件2, 甲做硬4, 丙做硬件3, 乙做硬件1; 最短时间=6+6+5+9=26。

第22章-组织通用治理(3分)

63、流程管理中，组织战略执行保障体系包含战略控制层、流程执行层、系统支撑层三层。其中，()是战略执行落地的核心枢纽；预算考核属于()。

- A.流程执行层；系统支撑层
- B.战略控制层；流程执行层
- C.战略控制层；系统支撑层
- D.流程执行层；战略控制层

【答案】 D

【解析】 P681, 在战略明晰的基础上，组织还需要构建战略执行保障体系，具体包括以下三层：

- 第一层：以会议管理、运行分析、预算考核为基础建立组织发展计划，形成以执行和控制为目标战略控制层。
- 第二层：以业务流程、岗位描述、绩效测评为基础架构，对研发、采购、生产与交付、销售、客服等各职能领域构建稳定的流程执行层。
- 第三层：以 ERP（组织资源规划）、CRM（客户关系管理）、PDM（产品数据管理）等大量的信息技术应用为基础的系统支撑层。

流程执行层是战略执行落地的核心枢纽，在整个战略执行保障体系中起承上启下的作用，组织的战略目标需要落实到流程上从而方便执行。

64、组织通用治理中，组织在分析和回顾战略实施过程中进行创新和改进的要素包括()。

- ①内外部发展环境对战略规划的影响
- ②在业务增长、发展趋势等方面的预测及其与实际差异
- ③提升业务增长和盈利的措施
- ④竞争优势和发展水平分析及措施
- ⑤流程规划和知识管理
- A.①②③④
- B.①③④⑤
- C.②③④⑤
- D.①②④⑤

【答案】 A

【解析】 P645，在分析和回顾战略实施过程中进行创新和改进的要素主要包括：

- 内外部发展环境对战略规划的影响，包括客户和用户需求、技术或监管环境等；
- 在业务增长、发展趋势等方面的预测及其与实际差异；
- 提升业务增长和盈利的措施；
- 竞争优势和发展水平分析及措施；
- 风险分析及措施。

65、组织在数字化转型中，()是转型成功与否的关键要素，使组织具备长期竞争优势。

- A.组织数字营销
- B.数字化产品和服务
- C.数字人才队伍
- D.组织数字文化

【答案】 D

【解析】P659, 数字化营销: 江山老师利用数字技术, 拓展产品和服务的传播渠道, 建设个性化客户和服务对象沟通服务体系, 实现精准营销

数字化产品和服务: 将数字化的理念和技术融入产品和服务中, 利用数字技术促进产品和服务研发创新及其能力智能化。

数字人才队伍: 搭建数字化人才队伍需要有足够且完备的人才储备, 人才组建要合理, 岗位职责要清晰。

组织数字文化: 组织文化是数字化转型成功与否的关键要素, 是指导一个团体行为的共同信念、价值观和思维模式。

第23章-组织通用管理(2分)

66、某企业管理层采取纠偏措施缩小目标与实际业绩之间的差距。该企业正在执行()阶段的营销活动。

A.市场营销组织 B.市场营销执行 C.市场营销控制 D.市场营销分析

【答案】C

【解析】P713, 市场营销控制。由于在营销计划的执行过程中会发生许多意想不到的情况, 市场营销者必须进行持续的市场营销控制, 即评价市场营销战略和计划的结果, 并采取纠偏措施以确保既定目标的实现。市场营销控制的步骤包括: 理层首先要设定具体的营销目标; 衡量其市场业绩, 找到造成预期业绩和实际业绩之间缺口的原因; 层采取纠偏措施缩小目标与实际业绩之间的差距, 包括改变行动计划, 或者改变目标本身

67、()通过财务、客户、内部运营、学习与成长4个角度, 将组织战略目标逐层分解转化为细化指标, 有差异化地针对不同的指标进行不同时间周期的绩效评估, 有助于组织战略目标的实现。

A.目标管理法 B.平衡计分卡法 C.硬性分布法 D.尺度评价表法

【答案】B

【解析】P651, 在具体应用中绩效评估的方法较多, 实际考评工作中比较常用的方法有:

(1)排序法。排序法是指根据工作绩效评估的高低对具有相同工作性质的员工进行排序的方法。该方法简便易行, 一般适用于工作内容单一或工作内容相同的员工较多时进行绩效评估。

(2)硬性分布法。硬性分布法是指将绩效评估结果进行分档, 评估者根据分档档次和分档比例对被评估者进行分派的方法。这种评估方法成本相对较低, 但绩效评估标准模糊, 主观性较高(C选项)。

(3)尺度评价表法。尺度评价表法是指评估者通过评估表的形式, 把绩效评估的每一项内容进行定量分解, 对被评估者的工作绩效进行考评打分, 最后将考评分值进行合计得到评估总分的方法。这种方法一般适用于对组织管理人员的绩效评估(江山老师D选项)。

(4)关键事件法。关键事件法是指评估者通过在日常工作中收集的与被评估者绩效评估相关的“重要事件”形成书面记录, 并进行整理和分析后, 最终形成评估结果的方法。一般情况下这种方法通常与其他方法结合使用, 不单独使用。

(5)平衡计分卡法。平衡计分卡法是指通过财务、客户、内部运营、学习与成长4个角度, 将组织的战略目标落实为可操作的衡量指标和目标值, 对被评估者进行综合考评的方法。平衡计分卡法是一种有效的绩效管理工具, 可以将组织战略目标逐层分解转化为相互平衡的细化指标, 从而有差异化地针对不同的指标进行不同时间周期的绩效评估, 有助于组织战略目标的实现。这种方法广泛应用于团队和个人的绩效评估(B选项)。

(6)目标管理法。目标管理法是指通过事先设定目标、制订计划对被评估者的工作目标完成情况进行绩效评估的方法。目标管理一般包括目标确定、计划执行、检查调整、完成评价等几个步骤。这种方法也广泛应用于对团队和个人的绩效评估(A选项)。

第24章-法律法规与标准规范(3分)

68、专利分类中, ()指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案; ()指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

A.实用新型发明 B.实用新型外观设计 C.发明外观设计 D.发明实用新型

【答案】D

【解析】P718, 2020年10月17日第四次修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称“专利法”)通过, 并于2021年6月1日正式实施。专利法规定, 发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是指对自然

方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计

69、关于数据安全法的描述，不正确的是：（）。

- A. 现行《中华人民共和国数据安全法》于2021年9月1日起正式施行
- B. 数据安全法延续了网络安全法生效以来的“一轴两翼三级”的监管体系，通过多方共同参与实现各地方、各部门对工作集中收集和产生数据的安全管理
- C. 数据安全法从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定
- D. 数据安全法是数据安全领域最高位阶的专门法，与网络安全法一起补充了《中华人民共和国国家安全法》框架下的安全治理法律体系

【答案】B

【解析】P719，《中华人民共和国数据安全法》（以下简称“数据安全法”）于2021年9月1日起正式施行（A选项正确）

数据安全法从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。（C选项正确）

数据安全法作为数据安全领域最高位阶的专门法，与网络安全法一起补充了《中华人民共和国国家安全法》框架下的安全治理法律体系（D选项正确）

更全面地提供了国家安全在各行业、各领域保障的法律依据。同时，数据安全法延续了网络安全法生效以来的“一轴两翼多级”的监管体系，通过多方共同参与实现各地方、各部门对工作集中收集和产生数据的安全管理。（B选项错误）

70、国家标准（）为信息技术服务体系的建立提供了范围基础。

- A. 《信息技术服务从业人员能力评价要求》
- B. 《信息技术服务服务安全要求》
- C. 《信息技术服务服务基本要求》
- D. 《信息技术服务分类与代码》

【答案】D

【解析】P728，《信息技术服务从业人员能力评价要求》该标准规定了信息技术服务从业人员的职业种类、能力要素等级和评价方法。

《信息技术服务服务安全要求》该标准提出了信息技术服务安全模型，规定了安全总则、生存周期和能力要素的安全要求。

《信息技术服务服务基本要求》该标准规定了信息技术服务中服务过程基本要求、信息技术咨询、设计与开发、信息系统集成实施、运行维护、数据处理和存储、运营等服务的活动内容和成果要求。

《信息技术服务分类与代码》该标准规定了信息技术服务的分类与代码，是信息技术服务分类、管理和编目的准则，为信息技术服务体系的建立提供了范围基础。（D选项正确）

英语题：（5分）

71、（）uses the data and results from the（）process to reflect the overall quality status of the project to the stakeholders.

- A. Control Quality plan quality management
- B. Plan Quality Management manage quality
- C. Manage Quality control quality
- D. Control Quality manage quality

【答案】C

【解析】（）使用（）过程中的数据和结果向利益相关者反映项目的总体质量状况

72、How frequently the risks are being reviewed,this should recorded in()

A.Risk Management Plan B.Issue Log C.Risk Register D.Risk Report

【答案】A

【解析】P447, 审查风险的频率, 应记录在()。

A-风险管理计划

B-问题日志

C-风险登记册

D-风险报告

风险登记册记录已识别项目风险的详细信息。

风险报告提供关于整体项目风险的信息, 以及关于已识别的单个项目风险的概述信息。在项目风险管理过程中, 风险报告的编制是一项渐进式的工作。

风险管理计划是项目管理计划的组成部分, 描述如何安排与实施风险管理活动(内容包括时间安排: 确定在项目生命周期中实施项目风险管理过程的时间和频率, 确定风险管理活动并将其纳入项目进度计划。)

问题日志: 江山老师所记录的问题可能引发单个项目风险, 还可能影响整体项目风险的级别。

73、Project Communications Management consists of two parts.The first part is developing a strategy to ensure communication is effective for stakeholders.The second part is carrying out the activities necessary to implement the ()

A.communication tools B.communication technology

C.communication cost D.communication strategy

【答案】D

【解析】P414, 项目沟通管理由两部分组成: 一是制定策略, 确保沟通对干系人行之有效; 二是执行必要活动, 以落实()。

A-沟通工具 B-沟通技术 C- 沟通成本 D-沟通策略

74、()is the process of specifying the approach and identifying potential sellers.

A.Plan Procurement Management

B.Close Procurement Management

C.Control Procurement

D.Conduct Procurement

【答案】A

【解析】P328, () 是明确采购方法和识别潜在卖方的过程。

A-规划采购管理 B-关闭采购管理 C-控制采购 D-实施采购

75、The project manager should use()tool for the purpose to report on the work remaining for projects.

A.cumulative flow diagram

B.burndown chart

C.forecast estimation

D.earned value

【答案】B

【解析】项目管理应该使用()工具用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。

A-累计流图B-燃尽图C- 预测估计D-挣值分析
